

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

002



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE	DATA MEDIÇÃO:	22/05/2024	VALOR DA MEDIÇÃO:	74.931,83
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ	CONTRATO:	008/2024	MODALIDADE:	TP 005/2023
PRAZOS DE EXEC.: 21/02/2024 a 20/06/2024	ADITIVO (DIAS):	-	-	-
ORDEM DE SERVIÇOS: 21/02/2024	PRAZO (DIAS):	120	ADITIVO (DIAS):	-
EMPRESA CONTRATADA: GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	PROPRIETÁRIO:	JOÃO BATISTA DA SILVA	DATA FINAL:	20/06/2024
CNPJ: 22.594.155/0001-36	CPF:	921.949.824-34	P. RESTANTE DIAS:	29
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA	CREA:	180.429.378-4	SALDO R\$:	70.376,16
	PE20241099726		PERÍODO DE MEDIÇÃO:	22/04/2024 a 22/05/2024
GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA	MATRÍCULA:	0543		
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA	CREA/RPN:	160.666.136-1		
ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA	CREA/RPN:	160.991.108-3_PE2024111502		
CNU: 90.018.35309/73				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>8.061,84</b>	<b>2.653,95</b>	<b>5.569,12</b>	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,90	36,00	11,85	24,87	4.784,40	1.575,02	3.305,06	69,08%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,52	72,00	23,70	49,74	3.277,44	1.078,93	2.264,06	69,08%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>18.944,78</b>	<b>2.195,68</b>	<b>17.546,98</b>	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	365,86	2,25	0,00	2,25	823,18	0,00	823,19	100,00%
2.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,70	217,00	0,00	217,00	2.321,90	0,00	2.321,90	100,00%
2.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	12,37	415,00	177,50	302,00	5.133,55	2.195,68	3.735,74	72,77%
2.4	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	49,61	215,00	0,00	215,00	10.666,15	0,00	10.666,15	100,00%
<b>3</b>	<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>						<b>135.228,98</b>	<b>34.462,42</b>	<b>76.332,60</b>	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	98,53	72,25	11,09	20,63	7.118,79	1.093,07	2.032,18	28,55%

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
 1429  
 Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
 Dados: 2024.05.22 14:18:19 -03'00'

JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
 4  
 Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
 Dados: 2024.05.22 15:31:19 -03'00'

RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459  
 151179  
 Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12290274000141, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.05.22 15:31:19 -03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	m³	3.067,24	31,76	8,03	19,20	97.415,54	24.620,74	58.887,08	60,45%
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	89,22	325,50	88,75	163,45	29.041,11	7.918,28	14.583,01	50,22%
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	5,08	325,50	163,45	163,45	1.653,54	830,33	830,33	50,22%
<b>4</b>	<b>CALÇADÃO</b>						<b>65.361,76</b>	<b>35.619,78</b>	<b>57.772,50</b>	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	83,69	379,20	213,00	338,96	31.735,24	17.825,97	28.200,18	88,86%
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	31,11	113,76	85,20	122,39	3.539,07	2.650,57	3.807,49	107,58%
4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023	m²	207,91	6,72	0,00	0,00	1.397,15	0,00	0,00	0,00%
4.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	78,07	90,60	35,50	60,40	7.073,14	2.771,49	4.715,43	66,67%
4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	69,70	302,00	177,50	302,00	21.049,40	12.371,75	21.049,40	100,00%
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	1,88	302,00	0,00	0,00	567,76	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>227.597,36</b>	<b>74.931,83</b>	<b>157.221,20</b>	<b>69,08%</b>

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.05.22 14:18:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

RONY MARCOS  
LOURENCO  
MOREIRA:02042151459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459  
SEI:02042151459  
Data: 2024.05.22 15:29:07-03'00'  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

JOAO BATISTA DA  
SILVA:92194982434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434  
SEI:92194982434  
Data: 2024.05.22 15:29:07-03'00'  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM 002**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO			TOTAL	OBSERVAÇÕES
					% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,90	36,00	36,16%	69,08%	32,92%	11,85	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 1.1</b>	<b>11,85</b>
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,52	72,00	36,16%	69,08%	32,92%	23,70	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 1.2</b>	<b>23,70</b>
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	12,37	415,00	COMPRIMENTO 177,50			TOTAL 177,50	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 2.3</b>	<b>177,50</b>
<b>3 MURO DE CONTENÇÃO</b>									
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	98,54	77,75	COMPRIMENTO 177,50 ALTURA 0,25 LARGURA 0,25			TOTAL 11,09	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 3.1</b>	<b>11,09</b>
3.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m²	3.067,24	31,76	COMPRIMENTO 177,50 ALTURA 0,20 LARGURA 0,20			TOTAL 7,10	Cinta superior
								1,20 0,15 1,40 0,25	0,25
								1,20 0,15 1,00 0,18	0,18
								1,00 0,15 1,00 0,30	2,00 0,30
								1,00 0,15 1,30 0,20	0,20
								<b>Total item 3.2</b>	<b>8,03</b>
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	89,22	325,50	COMPRIMENTO 177,50 ALTURA MÉDIA 0,50			TOTAL 88,75	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 3.3</b>	<b>88,75</b>
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,08	325,50	COMPRIMENTO 124,50 ALTURA MÉDIA 0,60			TOTAL 74,70	De acordo com a evolução da obra
								177,50 0,50	88,75
								<b>Total item 3.4</b>	<b>163,45</b>
<b>4 CALÇADÃO</b>									
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	83,69	379,20	COMPRIMENTO 177,50 ALTURA 1,20			TOTAL 213,00	De acordo com a evolução da obra
								<b>Total item 4.1</b>	<b>213,00</b>
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,11	113,76	COMPRIMENTO 177,50 ALTURA 0,40 LARGURA 1,20			TOTAL 85,20	De acordo com a evolução da obra

**ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429**

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.05.22 14:26:09 -03'00'

**JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243**

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
ID: C=BR, CN=CP-BRASIL, OU=0986021000104, OU=Secretaria de Renda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Imprensa, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2024.05.22 15:27:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459**

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP CERTIFICA AMAPOLIS-05, OU=12290274800141, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.22 15:27:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM 002**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO		Total item 4,2	TOTAL	OBSERVAÇÕES
					COMPRIMENTO	LARGURA			
4.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,07	90,60	177,50	0,20	85,20	35,50	De acordo com a evolução da obra
4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2018	M	69,70	302,00	177,50		35,50	177,50	De acordo com a evolução da obra
							<b>TOTAL ITEM 4,2</b>	<b>177,50</b>	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.05.22 14:20:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

RONEY MÁRCOS  
LOURENÇO  
MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO




JOAO BATISTA DA  
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06950031000104, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A1, OU=SEM BRANCO, OU=Assinador  
CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.22 15:27:18-03'00'  
Form: PDF Reader Versão: 2024.1.0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

VISÃO GERAL DA OBRA

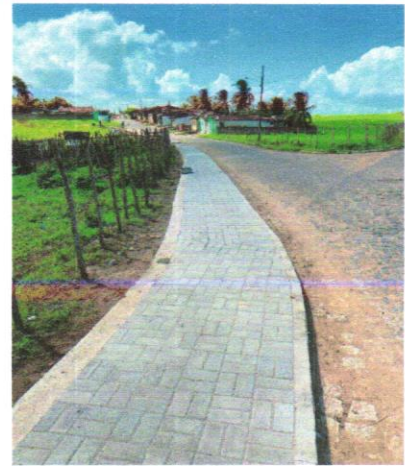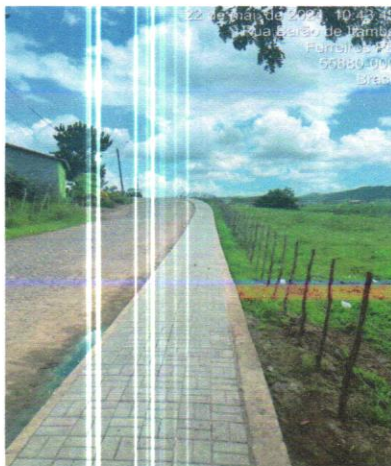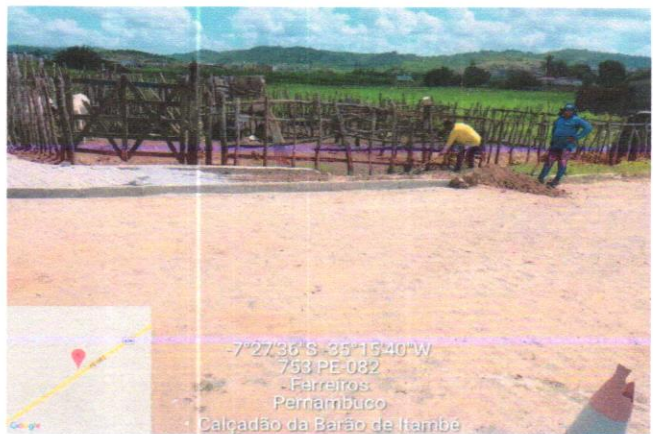

**RONNEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459**

Assinado digitalmente por RONEI MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459  
ND: CNBR, CNCP-Brazil, CNAC, CERTIFICA A MAPS v5, CN=122627400141, CN=Vide o retrans, (C) = Certificado PF A1, CN=RONNEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.22 15:25:57-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243**

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
ND: CNBR, CNCP-Brazil, CN=0960031000104, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF A1, CN=JOAO BRANCO, CN=Presencial, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.22 15:26:16-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429**

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.05.22 14:20:38-03'00"

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BATASTA DA SILVA Nº 10 DE ITAM BE



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA-07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA-07963031429

Data: 2024.05.22 14:21:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA-02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA-02042151459. Dados: 2024.05.22 14:25:08-03'00'.

JOAO BATISTA DA SILVA-9219498243

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA-9219498243. Dados: 2024.05.22 15:25:08-03'00'.

**PREF. M. DE S. LOURENÇO DA MATA****Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

**00001487**

Competência:

**MAI/2024**

Data e Hora Emissão:

**22/05/2024 15:46:46**

Código de Verificação:

**DIIS-YRNDW****INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

**EXIGÍVEL**

Regime de Tributação:

**SIMPLES NACIONAL**

Município de Incidência do ISS:

**FERREIROS - PE**

Local da Prestação:

**FERREIROS - PE**

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

**SIM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**22.594.155/0001-36**

Inscrição Municipal:

**11080**

Nome/Razão Social:

**GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**

Endereço:

**RUA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA, CENTRO, 105**

Município:

UF:

CEP: **54735335**

E-mail:

**glidden@hotmail.com**TEL: **8188083793****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**11.361.870/0001-02**

Inscrição Municipal:

---

Inscrição Estadual:

---

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Endereço:

**AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32 CENTRO**

Município:

**FERREIROS**UF: **PE**CEP: **55880000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.000 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO #QTD:1 - V.UND.:R\$74.931,83 - TOTAL:R\$74.931,83 - DED.:R\$44.959,09

C. C. - L. TO N 008/PMF/2024.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBE - FERREIROS/PE.

BM 02

MATERIAL 60% R\$ 44.959,09

MAO DE OBRAS 40% R\$ 29.972,74

DADOS BANCARIOS:

BANCO SANTANDER

AGENCIA 4059

CONTA CORRENTE 13001685-4

Atesto que os Serviços / Produtos  
Foram Efetivamente Prestados / Entregues**23/05/2024**  
*Roberto Teles***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.931,83**

Atividade Prestada:

**4213800 -**

Código CNAE:

**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
73.433,19	44.959,09	29.972,74	5,00%	1.498,64
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

816417261476323

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da
