

BOLETIM DE MEDIÇÃO

004



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE	DATA MEDIÇÃO: 09/09/2024	VALOR DA MEDIÇÃO: 22.668,74
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ	CONTRATO: 008/2024	MODALIDADE: TP 005/2023
PRAZOS DE EXEC.: 21/02/2024 a 21/05/2024	ADITIVO (DIAS): 180	-
ORDEN DE SERVIÇOS: 21/02/2024	PRAZO (DIAS): 90	
EMPRESA CONTRATADA: GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	PROPRIETÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA	
CNPJ: 22.594.155/0001-36	CPF: 921.949.824-34	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA	CREA: 180.429.378-4	PE20241099726
GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA	MATRÍCULA: 0543	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/07/2024
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA	CREA/RPN: 160.666.136-1	
ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA	CREA/RPN: 160.991.108-3_PE2024111502	
CNO: 90.018.38309/73		P. RESTANTE DIAS: 69
		SALDO R\$: 0,00
		À 09/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12.639,00	1.279,78	12.639,00	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,90	54,00	5,47	54,00	7.176,60	726,99	7.176,60	100,00%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,52	120,00	12,14	120,00	5.462,40	552,79	5.462,40	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.372,29	0,00	18.372,29	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	365,86	2,25	0,00	2,25	823,18	0,00	823,18	100,00%
2.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,70	217,00	0,00	217,00	2.321,90	0,00	2.321,90	100,00%
2.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	12,37	302,00	0,00	302,00	3.735,74	0,00	3.735,74	100,00%
2.4	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	49,61	215,00	0,00	215,00	10.666,15	0,00	10.666,15	100,00%
2.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	3,76	219,50	0,00	219,50	825,32	0,00	825,32	100,00%
3	MURO DE CONTENÇÃO						84.632,27	6.365,25	84.632,27	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	98,53	23,13	0,00	23,13	2.278,99	0,00	2.278,99	100,00%

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:11:51 -03'00'

RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC, SERIAL=160991108-3, OU=PE, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFB -CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=JOÃO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.09.09 20:54:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFB -CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=JOÃO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.09.09 20:54:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Cesar Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3.067,24	19,38	0,00	19,38	59.443,11	0,00	59.443,11	100,00%
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	89,22	242,95	67,50	242,95	21.675,99	6.022,35	21.675,99	100,00%
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,08	242,95	67,50	242,95	1.234,18	342,90	1.234,18	100,00%
4	CALÇADÃO						108.278,65	15.023,71	108.278,65	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	83,69	715,06	117,80	715,06	59.843,37	9.858,68	59.843,37	100,00%
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,11	177,20	38,49	177,20	5.512,69	1.197,49	5.512,69	100,00%
4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	207,91	18,45	18,45	18,45	3.835,93	3.835,94	3.835,93	100,00%
4.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,07	90,60	0,00	90,60	7.073,14	0,00	7.073,14	100,00%
4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	69,70	302,00	0,00	302,00	21.049,40	0,00	21.049,40	100,00%
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,88	370,00	70,00	370,00	695,60	131,60	695,60	100,00%
4.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,57	70,00	0,00	70,00	3.119,90	0,00	3.119,90	100,00%
4.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	321,91	2,00	0,00	2,00	643,82	0,00	643,82	100,00%
4.9	Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=7m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	2.877,04	1,00	0,00	1,00	2.877,04	0,00	2.877,04	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314
29

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:12:00
-03'00'


RONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042
151459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151459
ID: C8E8, CN=C=Brasil, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, OU=12200274000141, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
RONEY MARCOS LOURENCO
MOREIRA:02042151459
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 20:55:15-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
ID: C8E8, CN=C=Brasil, OU=9860031000104, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CF A1, OU=EM BRANCO, OU=preselec
CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 20:54:20-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2


César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	761,71	2,00	0,00	2,00	1.523,42	0,00	1.523,42	100,00%
4.11	Banco de concreto pre-moldado com encosto	UN	1.052,17	2,00	0,00	2,00	2.104,34	0,00	2.104,34	100,00%
TOTAL							223.922,22	22.668,74	223.922,22	100,00%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:12:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RONEY MARCOS LOURENCO
MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459
MEX: C=BR, O=ICMSP, OU=ICMSP CERTIFICA ANAPOLIS v3, OU=1200276020141, OU=HidrecoInformatica, OU=Certificado PF A1, CN=RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA 02042151459
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.09.09 20:55:27-03'00'
Forn PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
MEX: C=BR, O=ICMSP, OU=089023000104, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=Presencial, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.09.09 10:56:56-03'00'
Forn PDF Reader Versão: 2024.2.2

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 004

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO			TOTAL	OBSERVAÇÕES
					% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,90	54,00	89,88%	100,00%	10,12%	5,47	Serviço concluído
								Total item 1.1	5,47
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,52	120,00	89,88%	100,00%	10,12%	12,14	Serviço concluído
								Total item 1.2	12,14
3 MURO DE CONTENÇÃO									
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	89,22	242,95				67,50	Serviço concluído
					TOTAL PREVISTO	DESCONTO ACUMULADO		TOTAL	
					242,95	-175,45		67,50	
								Total item 3.3	67,50
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,08	242,95				67,50	Serviço concluído
					TOTAL PREVISTO	DESCONTO ACUMULADO		TOTAL	
					242,95	-175,45		67,50	
								Total item 3.4	67,50
4 CALÇADÃO									
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	83,69	715,06				117,80	Serviço concluído
					TOTAL PREVISTO	DESCONTO ACUMULADO		TOTAL	
					715,06	-597,26		117,80	
								Total item 4.1	117,80
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,11	177,20				38,49	Serviço concluído
					TOTAL PREVISTO	DESCONTO ACUMULADO		TOTAL	
					177,20	-138,71		38,49	
								Total item 4.2	38,49
4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	207,91	18,45				18,45	Serviço concluído
					PREVISTO			TOTAL	
					18,45			18,45	
								Total item 4.3	18,45
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,88	370,00				70,00	Serviço concluído
					COMPRIMENTO			TOTAL	
					70,00			70,00	
								Total item 4.6	70,00

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:12:19 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RONÉY MARCOS LOURENÇO
MOREIRA:02042151459
GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Dados: 2024.09.09 20:55:54-03'00'
Fúzeil PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

VISÃO GERAL DA OBRA

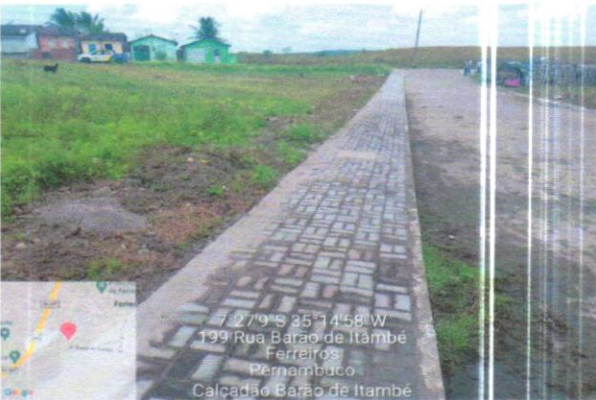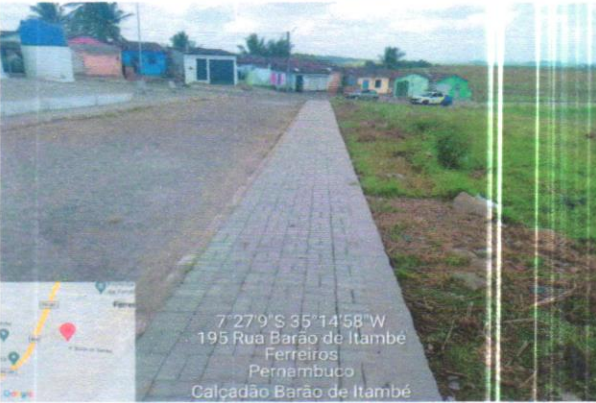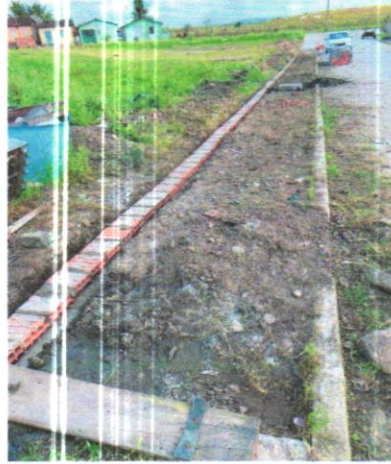

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314
29

Assinado digitalmente por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:12:27 -03'00'


RONY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:0204215
1459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459
Dados: 2024.09.09 21:01:26-03'00'
Post: PDF Reader Versão: 2024.2.2

JOAO
BATISTA DA
SILVA:92194
982434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Dados: 2024.09.09 21:52:30-03'00'
Post: PDF Reader Versão: 2024.2.2


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEGUNDA PARTE DA RUA BARÃO DE ITAMBÉ

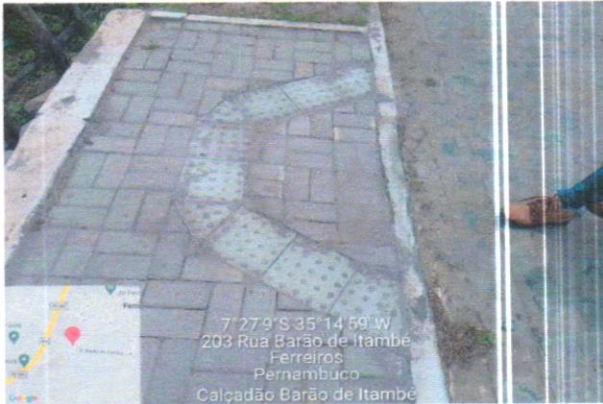

7° 27' 9" S 35° 14' 59" W
203 Rua Barão de Itambé
Ferreiros
Pernambuco
Calçada Barão de Itambé



7° 27' 9" S 35° 14' 58" W
195 Rua Barão de Itambé
Ferreiros
Pernambuco
Calçada Barão de Itambé

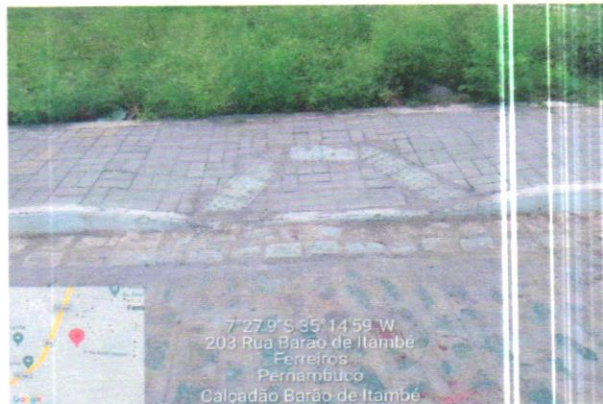

7° 27' 9" S 35° 14' 59" W
203 Rua Barão de Itambé
Ferreiros
Pernambuco
Calçada Barão de Itambé



7° 27' 9" S 35° 14' 58" W
195 Rua Barão de Itambé
Ferreiros
Pernambuco
Calçada Barão de Itambé

Cesar Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.09.09 16:12:39 -03' 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RONY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042151459
GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Selo Digital - Certificado: CN=088501180104, OU=Secretaria de Recursos Humanos - RRIS, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFERMAGEM, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Assinado em: 2024-09-09 17:07:55-0302
Formato: PKCS#7
Método de Assinatura: X.509
