

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 31/07/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 47.378,95

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

CONTRATO R\$: 78.210,63

CONTRATO:

104/2025

MODALIDADE:

DISPENSA Nº
014/2025

PRAZOS DE EXEC.:

13/06/2025

11/09/2025

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS:

13/06/2025

PRAZO (DIAS):

90

ADITIVO (DIAS):

-

-

C. ADITADO R\$: 78.210,63

EMPRESA CONTRATADA:

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

REPRESENTANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

DATA FINAL: 11/09/2025

CNPJ: 22.594.155/0001-36

CPF: 921.949.824-34

P. RESTANTE
DIAS: 42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA

CREA: 180.429.378-4

PE20251359320

SALDO R\$: 30.831,68

A 31/07/2025

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/06/2025

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIADO DE SOUSA

MATRÍCULA: 0543

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.666.136-1

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20251374668

CNO: 90.024.71109/78

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.579,04	1.579,04	1.579,04	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	493,70	1,50	1,50	1,50	740,55	740,55	740,55	100,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1,91	439,00	439,00	439,00	838,49	838,49	838,49	100,00%
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						10.261,72	9.518,85	9.518,85	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,44	90,00	90,00	90,00	4.719,60	4.719,60	4.719,60	100,00%
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	39,33	36,00	31,35	31,35	1.415,88	1.232,99	1.232,99	87,08%
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	124,44	18,00	13,50	13,50	2.239,92	1.679,94	1.679,94	75,00%
2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	29,20	64,60	64,60	64,60	1.886,32	1.886,32	1.886,32	100,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO						19.722,49	19.722,49	19.722,49	
3.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.543,95	1,00	1,00	1,00	2.543,95	2.543,95	2.543,95	100,00%
3.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	4.350,37	1,00	1,00	1,00	4.350,37	4.350,37	4.350,37	100,00%
3.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.090,49	1,00	1,00	1,00	2.090,49	2.090,49	2.090,49	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.31 10:25:20 -03'00'JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=26162341000157, OU=AC Simgespro Multipla, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:47:11-03'00'RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:0204215Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENÇO MOREIRA:02042151468
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferência, OU=26162341000157,
OU=AC Simgespro Multipla, CN=RONEY
MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:47:11-03'00'César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND	46,30	3,00	3,00	3,00	138,90	138,90	138,90	100,00%
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,77	100,00	100,00	100,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	100,00%
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UND	171,02	3,00	3,00	3,00	513,06	513,06	513,06	100,00%
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020_PS	UND	902,13	1,00	1,00	1,00	902,13	902,13	902,13	100,00%
8	PAISAGISMO						3.958,38	0,00	0,00	
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	21,47	50,00	0,00	0,00	1.073,50	0,00	0,00	0,00%
8.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	5,07	146,50	0,00	0,00	742,75	0,00	0,00	0,00%
8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	UND	140,85	3,00	0,00	0,00	422,55	0,00	0,00	0,00%
8.4	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	205,46	2,00	0,00	0,00	410,92	0,00	0,00	0,00%
8.5	PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	320,15	2,00	0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	0,00%
8.6	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	24,73	15,00	0,00	0,00	370,95	0,00	0,00	0,00%
8.7	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	8,47	30,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00%
8.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	96,25	0,45	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00%
9	ACESSIBILIDADE						1.117,20	0,00	0,00	
9.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	372,40	3,00	0,00	0,00	1.117,20	0,00	0,00	0,00%
10	SERVIÇOS FINAIS						1.278,84	0,00	0,00	
10.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1.278,84	1,00	0,00	0,00	1.278,84	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							78.210,63	47.378,95	47.378,95	60,58%
É OBRIGATÓRIO O CARIMBO. ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Dados: 2025.07.31 10:26:02 -03'00' PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO César Marcelino da Silva Secretário de Obras Mat. 543 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459 GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO										

JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 001

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES	
				PREVISTA	MEDIDO NO PERÍODO				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	493,70	1,50	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					1,50		1,00	1,50	
								Total item 1.1 1,50	
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1,91	439,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					32,28	13,60		439,00	
								Total item 1.2 439,00	
2 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,44	90,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					90,00			90,00	
								Total item 2.1 90,00	
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	39,33	36,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					19,00	1,65		31,35	
								Total item 2.2 31,35	
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	124,44	18,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					90,00	0,50	0,30	13,50	
								Total item 2.3 13,50	
2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	29,20	64,60	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					32,30	2,00		64,60	
								Total item 2.4 64,60	
3 EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO									
3.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.543,95	1,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								1,00 1,00	
								Total item 3.1 1,00	
3.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	4.350,37	1,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								1,00 1,00	
								Total item 3.2 1,00	
3.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.090,49	1,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429Assinado digitalmente por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.31 10:26:15
-03'00'JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=26102341000157,
OU=AC SyngularID Multiple, CN=JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:49:28-03'00"
Faxir PDF Reader Versão: 2024.2.2RONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042151
459Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151459
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=26152341000157,
OU=AC SyngularID Multiple, CN=RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151459
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:49:09-03'00"
Cert DNE - Diretoria Municipal - 00794 0 0César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

MEMORIAL DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 001

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES
					MEDIDO NO PERÍODO				
								1,00 1,00	
								Total item 3.3 1,00	
3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	5.175,25	1,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								1,00 1,00	
								Total item 3.4 1,00	
3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	5.562,43	1,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								1,00 1,00	
								Total item 3.5 1,00	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	2.705,42	3,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								3,00 3,00	
								Total item 7.1 3,00	
7.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	529,12	6,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								6,00 6,00	
								Total item 7.2 6,00	
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,36	100,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					100,00			100,00 100,00	
								Total item 7.3 100,00	
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,77	60,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					60,00			60,00 60,00	
								Total item 7.4 60,00	
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	61,43	10,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
					10,00			10,00 10,00	
								Total item 7.5 10,00	
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND	46,30	3,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado
								3,00 3,00	
								Total item 7.6 3,00	
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,77	100,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.31 10:26:25 -03'00'

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=26162341000157, OU=AC SingularID Multipla, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Racião: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:49:42-03'00'

RONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:020421514

59

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151459
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=26162341000157, OU=AC SingularID Multipla, CN=RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459
Racião: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:49:52-03'00'

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL**BM 001**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES
					MEDIDO NO PERÍODO				
					100,00				100,00
								Total item 7.7	100,00
					COMPRIENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UND	171,02	3,00					Serviço executado
								3,00	3,00
								Total item 7.8	3,00
					COMPRIENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA), AF_07/2020_PS	UND	902,13	1,00					Serviço executado
								1,00	1,00
								Total item 7.9	1,00
César Marcelino da Silva									

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

César Marcelino da Silva

Secretário de Obras

Mat 543



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATOITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Data: 2025.07.31 10:25:36 -03'00'PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃORONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042151459GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
TÉCNICO EXECUÇÃOAssinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA
CPF: 02042151459
Data: 2025.07.31 10:25:36 -03'00'Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
CPF: 26162341069157, OUVAC Syngulato Multiplo,
CNPJ:JOAO BATISTA DA SILVA 9219498243
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 10:56:16 -03'00'
Fundo PDF Reader Versão: 2024.2.2JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

CONSTRUÇÃO DA PRACA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

PLACA DA OBRA



VISÃO GERAL DA OBRA

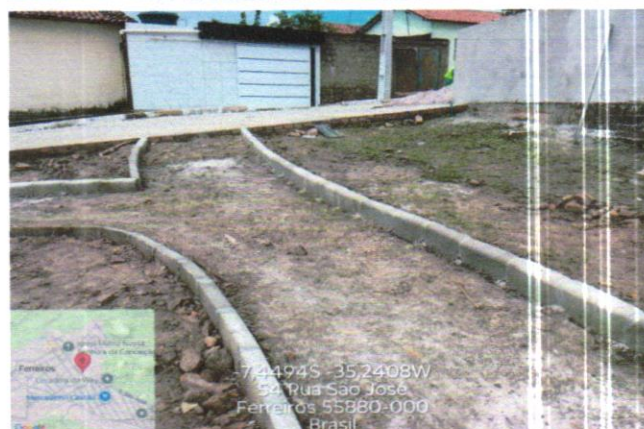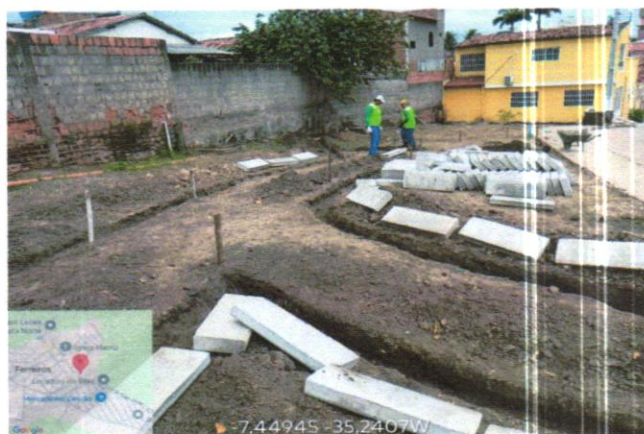

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.31 10:26:45
-03'00'





JOAO BATISTA
DA
SILVA:92194982
434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219462434
 ID: C=BR, OU=Videconferencias, OU=PF A1, OU=Videoconferencias, OU=29162941009137, OU=AC Syngular do Múltiplo, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219462434
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.07.31 10:50:34-03'00'
 Ffnd: PDF Render Versão: 20.04.2.2

RONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:020421
51459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:22042151459
 CN=C=DR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
 PF A1, OU=Videoconferencia, OU=26162341000157, OU=AC Syngaster ID Multiplex,
 CN=RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:22042151459
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.07.31 10:50:45-03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

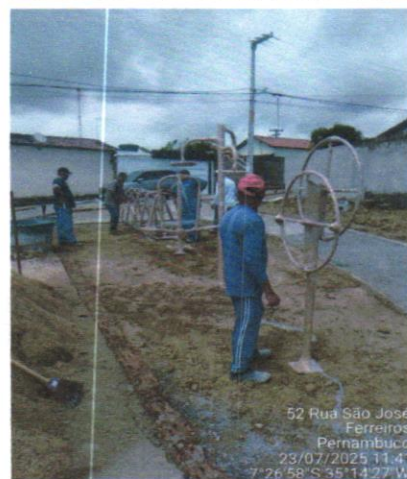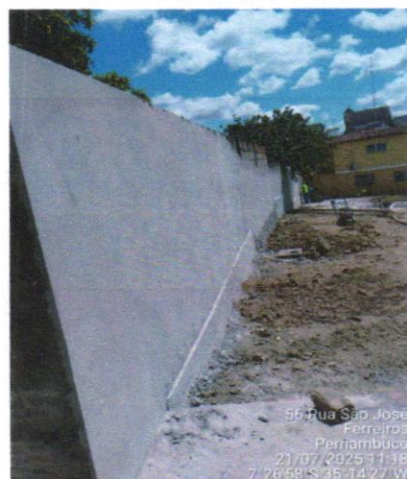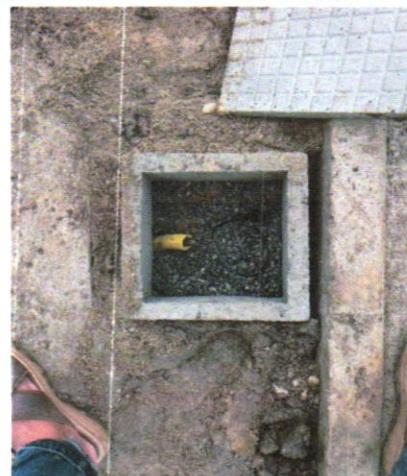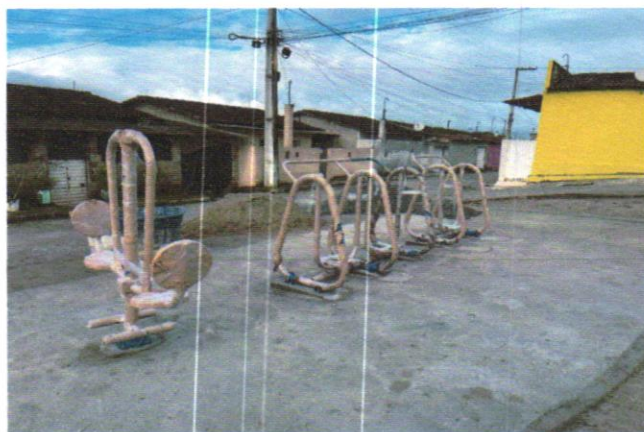

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543

**RONEY MARCOS
LOURENÇO**
MOREIRA:02042151459

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

**ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA: 07963031429
Dados: 2025.07.31 10:27:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

JOAO BATISTA DA

Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DA SILVA em 2025.07.31 10:27:18 -03'00'
