

BOLETIM DE MEDIÇÃO

002



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 09/09/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 18.843,61

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

CONTRATO R\$: 78.210,63

CONTRATO:

104/2025

MODALIDADE:

DISPENSA N°
014/2025

PRAZOS DE EXEC.:

13/06/2025

11/09/2025

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS:

13/06/2025

PRAZO (DIAS):

90

ADITIVO (DIAS):

-

-

C. ADITADO R\$: 78.210,63

EMPRESA CONTRATADA:

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

REPRESENTANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

DATA FINAL: 11/09/2025

CNPJ: 22.594.155/0001-36

CPF: 921.949.824-34

P. RESTANTE
DIAS: 2

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA

CREA: 180.429.378-4

PE20251359320

SALDO R\$: 11.988,07

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA

MATRÍCULA: 0543

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 31/07/2025

A 09/09/2025

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIADO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20251374668

CNO: 90.024.71109/78

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.579,04	0,00	1.579,04	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	493,70	1,50	0,00	1,50	740,55	0,00	740,55	100,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	M2	1,91	439,00	0,00	439,00	838,49	0,00	838,49	100,00%
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						10.261,72	0,00	9.518,85	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	52,44	90,00	0,00	90,00	4.719,60	0,00	4.719,60	100,00%
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	39,33	36,00	0,00	31,35	1.415,88	0,00	1.232,99	87,08%
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	124,44	18,00	0,00	13,50	2.239,92	0,00	1.679,94	75,00%
2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	29,20	64,60	0,00	64,60	1.886,32	0,00	1.886,32	100,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO						19.722,49	0,00	19.722,49	
3.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UND	2.543,95	1,00	0,00	1,00	2.543,95	0,00	2.543,95	100,00%
3.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UND	4.350,37	1,00	0,00	1,00	4.350,37	0,00	4.350,37	100,00%
3.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UND	2.090,49	1,00	0,00	1,00	2.090,49	0,00	2.090,49	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.09 17:07:06 -03'00'RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151
459Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENÇO MOREIRA:02042151459
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferência, OU=26102341000157,
OU=AC Siqueira do Mello, CN=RONEY MARCOS
LOURENÇO MOREIRA:02042151459
Localização:
Data: 2025.09.10 06:34:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0JOAO BATISTA
DA
SILVA:921949824
34Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=
26102341000157, OU=AC Siqueira do Mello,
CN=JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Localização:
Data: 2025.09.10 06:35:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 343

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UND	5.175,25	1,00	0,00	1,00	5.175,25	0,00	5.175,25	100,00%
3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UND	5.562,43	1,00	0,00	1,00	5.562,43	0,00	5.562,43	100,00%
4	PERGOLADO						3.160,53	3.160,53	3.160,53	
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	96,25	0,20	0,20	0,20	19,25	19,25	19,25	100,00%
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	39,33	1,00	1,00	1,00	39,33	39,33	39,33	100,00%
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	28,71	0,07	0,07	0,07	2,06	2,06	2,06	100,00%
4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	529,18	0,08	0,08	0,08	42,33	42,33	42,33	100,00%
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	69,49	44,00	44,00	44,00	3.057,56	3.057,56	3.057,56	100,00%
5	PLAYGROUND						5.596,02	5.596,02	5.596,02	
5.1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	137,85	6,00	6,00	6,00	827,10	827,10	827,10	100,00%
5.2	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ ORLA ATALAIA NOVA	UND	1.394,23	2,00	2,00	2,00	2.788,46	2.788,46	2.788,46	100,00%
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	69,49	28,50	28,50	28,50	1.980,46	1.980,46	1.980,46	100,00%
6	MOBILIÁRIO URBANO E BANCOS						14.977,84	5.011,48	5.011,48	
6.1	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPAS VAJE VEM	UND	422,76	1,00	0,00	0,00	422,76	0,00	0,00	0,00%
6.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	UND	1.252,87	4,00	4,00	4,00	5.011,48	5.011,48	5.011,48	100,00%
6.3	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MÍNIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIÃO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)	M2	79,53	120,00	0,00	0,00	9.543,60	0,00	0,00	0,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.558,57	0,00	16.558,57	
7.1	POSTE DE AÇO CONÍCO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UND	2.705,42	3,00	0,00	3,00	8.116,26	0,00	8.116,26	100,00%
7.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	529,12	6,00	0,00	6,00	3.174,72	0,00	3.174,72	100,00%
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,36	100,00	0,00	100,00	736,00	0,00	736,00	100,00%
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,77	60,00	0,00	60,00	286,20	0,00	286,20	100,00%
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	61,43	10,00	0,00	10,00	614,30	0,00	614,30	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2025.09.09 17:07:16 -03'00'

RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459

Assinado eletronicamente por RONEY MARCOS LOURENÇO
RONEI L. MOREIRA - 02042151459
CPF: 02042151459
Assinado eletronicamente por RONEY MARCOS LOURENÇO
RONEI L. MOREIRA - 02042151459
CPF: 02042151459
Assinado eletronicamente por RONEY MARCOS LOURENÇO
RONEI L. MOREIRA - 02042151459
CPF: 02042151459

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
CPF: 9219498243
Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
CPF: 9219498243
Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
CPF: 9219498243

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 343

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND	46,30	3,00	0,00	3,00	138,90	0,00	138,90	100,00%
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,77	100,00	0,00	100,00	2.077,00	0,00	2.077,00	100,00%
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UND	171,02	3,00	0,00	3,00	513,06	0,00	513,06	100,00%
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UND	902,13	1,00	0,00	1,00	902,13	0,00	902,13	100,00%
8	PAISAGISMO						3.958,38	3.958,38	3.958,38	
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	21,47	50,00	50,00	50,00	1.073,50	1.073,50	1.073,50	100,00%
8.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	5,07	146,50	146,50	146,50	742,75	742,75	742,75	100,00%
8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	UND	140,85	3,00	3,00	3,00	422,55	422,55	422,55	100,00%
8.4	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	205,46	2,00	2,00	2,00	410,92	410,92	410,92	100,00%
8.5	PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M. FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	320,15	2,00	2,00	2,00	640,30	640,30	640,30	100,00%
8.6	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	24,73	15,00	15,00	15,00	370,95	370,95	370,95	100,00%
8.7	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	8,47	30,00	30,00	30,00	254,10	254,10	254,10	100,00%
8.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	96,25	0,45	0,45	0,45	43,31	43,31	43,31	100,00%
9	ACESSIBILIDADE						1.117,20	1.117,20	1.117,20	
9.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	372,40	3,00	3,00	3,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS						1.278,84	0,00	0,00	
10.1	PLAÇA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UND	1.278,84	1,00	0,00	0,00	1.278,84	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							78.210,63	18.843,61	66.222,56	84,67%

PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, DE ACORDO COM A CURVA ABC DA REFERIDA OBRA, QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO DA OBRA, TEMOS A SEGUINTE PROPORÇÃO ENTRE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS:

- MÃO-DE-OBRA: 10,55%, equivalente a R\$ 1.988,00 (para esta medição)

- MATERIAL: 89,45%, equivalente a R\$ 16.855,61 (para esta medição)

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.09 17:07:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RONNEY MARCOS LOURENCO
MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Nº do Cert. 15618496, Ocorrência do Certificado Digital PP A1, 0204
Validade do certificado: 09/25/2026 18:00:00, OU=AC Sinterland
Módulo: 02042151459, OU=AC Sinterland
Público: Em nome e poder deste documento.
Localização:
Data: 2025.09.10 16:29:14-03'00'
Público PDF Reader Versão: 2025.2.0

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 002

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO				OBSERVAÇÕES
					COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	
4	PERGOLADO								
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	M3	96,25	0,20				0,20	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 4.1 0,20	
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	39,33	1,00				1,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 4.2 1,00	
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	M3	28,71	0,07				0,07	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 4.3 0,07	
4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	529,18	0,08				0,08	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 4.4 0,08	
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	69,49	44,00				44,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 4.5 44,00	
5	PLAYGROUND								
5.1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	137,85	6,00				6,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 5.1 6,00	
5.2	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO PIORLA ATALAIA NOVA	UND	1.394,23	2,00				2,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 5.2 2,00	
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	69,49	28,50				28,50	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 5.3 28,50	
6	MOBILIÁRIO URBANO E BANCOS								
6.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00M	UND	1.252,87	4,00				4,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 6.2 4,00	
8	PAISAGISMO								
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF 07/2024	M2	21,47	50,00				50,00	Serviço executado - vide projeto básico
								Total item 8.1 50,00	
8.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF 07/2024	M2	5,07	146,50					Serviço executado - vide projeto básico

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.09 17:07:45
-03'00'RONEY MARCOS
LOURENCO
MORAIRA:020421514
59Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO
MORAIRA:02042151459
ND: C=BR, O=MCP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=26162341000157, OU=AC
SyngularID Múltiplo, CN=RONEY MARCOS LOURENCO
MORAIRA:02042151459
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.10 08:39:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
4Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=MCP-Brazil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
26162341000157, OU=AC SyngularID Múltiplo,
CN=JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.10 08:39:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 002

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES
					MEDIDO NO PERÍODO				
							146,50	146,50	
							Total Item 8.2	146,50	
8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	UND	140,85	3,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							3,00	3,00	
							Total Item 8.3	3,00	
8.4	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	205,46	2,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							2,00	2,00	
							Total Item 8.4	2,00	
8.5	PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	320,15	2,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							2,00	2,00	
							Total Item 8.5	2,00	
8.6	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	24,73	15,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							15,00	15,00	
							Total Item 8.6	15,00	
8.7	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	8,47	30,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							30,00	30,00	
							Total Item 8.7	30,00	
8.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	M3	96,25	0,45	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
							0,45	0,45	
							Total Item 8.8	0,45	
9	ACESSIBILIDADE				COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	
9.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	372,40	3,00					Serviço executado - vide projeto básico
							3,00	3,00	
							Total Item 9.1	3,00	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2025.09.09 12:07:54 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATORONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459
Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO
MOREIRA:02042151459
Dados: 2025.09.09 12:07:54 -03'00'
GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
TÉCNICO EXECUÇÃOCésar Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 343JOAO BATISTA
DA
SILVA:9219498
2434
Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
Dados: 2025.09.10 09:39:27 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

VISÃO GERAL DA OBRA

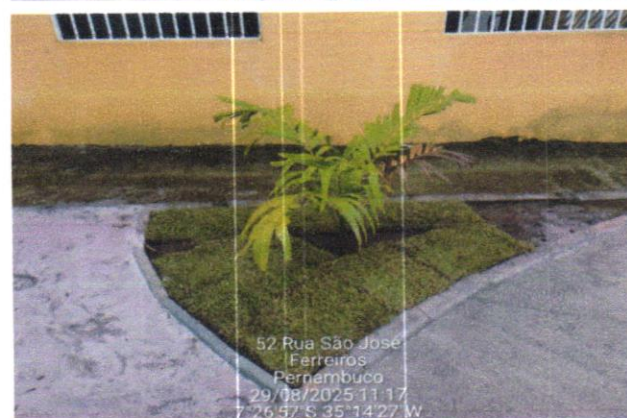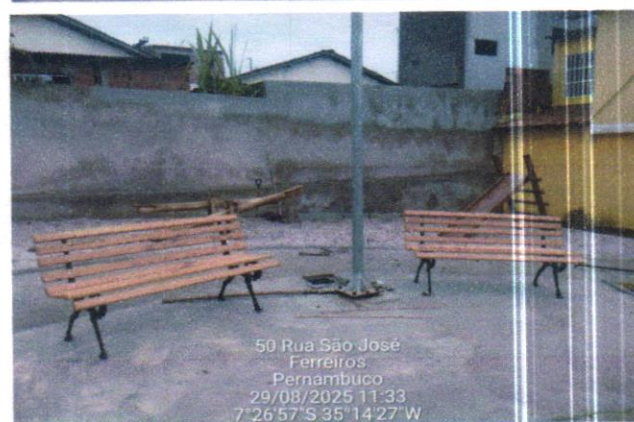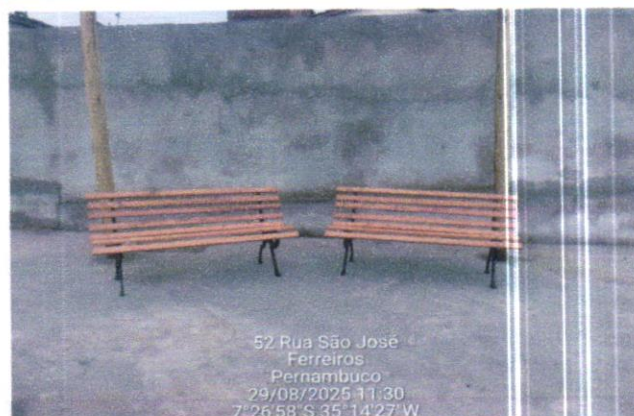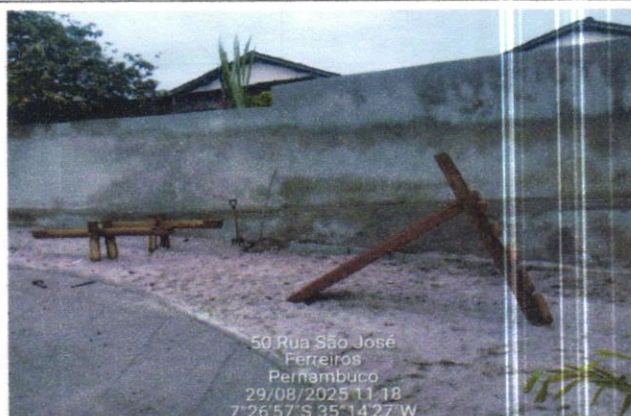

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.09 17:08:03
-03'00'



RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

Assinado digitalmente por: RONEY MARCOS LOURENÇO
MORERBA:02042151459
Tipo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Viceprefeitura, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Módulo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Módulo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Assinado digitalmente por: JOAO BATISTA DA SILVA
MORERBA:02042151459
Tipo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Viceprefeitura, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Módulo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Assinado digitalmente por: JOAO BATISTA DA SILVA
MORERBA:02042151459
Tipo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Viceprefeitura, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Módulo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Assinado digitalmente por: JOAO BATISTA DA SILVA
MORERBA:02042151459
Tipo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Viceprefeitura, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID
Módulo: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25162341000157, OU=AC SyngeneID

Code Marcelino da Silva
Secretário de Obras 07963031429
Mat 343

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

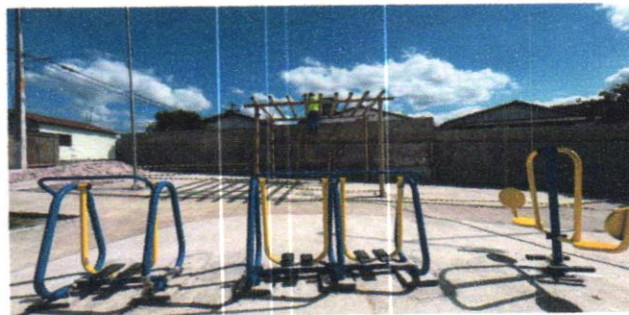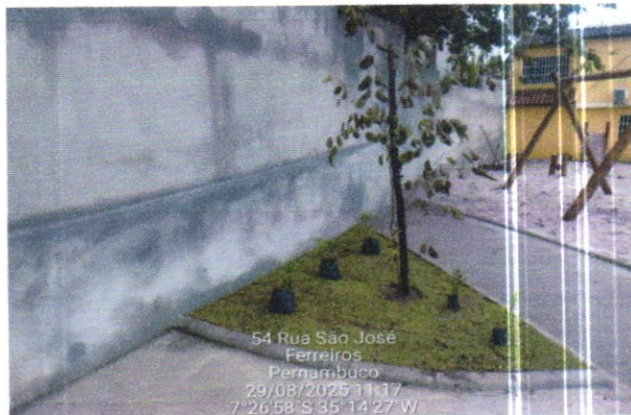

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃOAssinado de forma digital por: ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Data: 2025.09.09 17:08:15 -1:4 30'


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATORONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃOCésar Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat. 543JOAO
BATISTA DA
SILVA:9219498
2434Assinado digitalmente por JOAO BATISTA
DA SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, QU=Videoconferencia, OU=
26162341000157, OU=AC-SingularID
Múltipla, CN=JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.10 08:40:32-0300'
Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0
