

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 18/09/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 9.543,60

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

CONTRATO R\$: 78.210,63

CONTRATO:

104/2025

MODALIDADE:

DISPENSA Nº
014/2025

PRAZOS DE EXEC.:

13/06/2025

11/09/2025

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS:

13/06/2025

PRAZO (DIAS):

90

ADITIVO (DIAS):

90

-

C. ADITADO R\$: 78.210,63

EMPRESA CONTRATADA:

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

REPRESENTANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

DATA FINAL: 10/12/2025

CNPJ: 22.594.155/0001-36

CPF: 921.949.824-34

P. RESTANTE
DIAS: 83

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA

CREA: 180.429.378-4 PE20251359320

SALDO R\$: 2.444,47

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIADO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
CNO: 90.024.71109/78

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/09/2025
MATRÍCULA: 0543
CREA/RPN: 160.666.136-1
CREA/RPN: 180.991.108-3 PE20251374668

A 18/09/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.579,04	0,00	1.579,04	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	493,70	1,50	0,00	1,50	740,55	0,00	740,55	100,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1,91	439,00	0,00	439,00	838,49	0,00	838,49	100,00%
2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						10.261,72	0,00	9.518,85	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,44	90,00	0,00	90,00	4.719,60	0,00	4.719,60	100,00%
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	39,33	36,00	0,00	31,35	1.415,88	0,00	1.232,99	87,08%
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	124,44	18,00	0,00	13,50	2.239,92	0,00	1.679,94	75,00%
2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	29,20	64,60	0,00	64,60	1.886,32	0,00	1.886,32	100,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO						19.722,49	0,00	19.722,49	
3.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.543,95	1,00	0,00	1,00	2.543,95	0,00	2.543,95	100,00%
3.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	4.350,37	1,00	0,00	1,00	4.350,37	0,00	4.350,37	100,00%
3.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	2.090,49	1,00	0,00	1,00	2.090,49	0,00	2.090,49	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.18 15:50:24
-03'00"

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243
SO: C=BR, O=CP, CN=João Batista da Silva, OU=CP
PP A1, OU=CP, CN=João Batista da Silva, OU=CP
25112241900157, OU=AC, CN=João Batista da Silva, OU=AC
João Batista da Silva, CN=João Batista da Silva, OU=AC
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.18 15:50:24
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:0204215
1459

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENÇO MOREIRA:02042151459
SO: C=BR, O=CP, CN=Roney Marcos Lourenço Moreira, OU=CP
A1, OU=CP, CN=Roney Marcos Lourenço Moreira, OU=CP
25112241900157, OU=AC, CN=Roney Marcos Lourenço Moreira, OU=AC
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.18 15:50:24
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND	46,30	3,00	0,00	3,00	138,90	0,00	138,90	100,00%
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,77	100,00	0,00	100,00	2.077,00	0,00	2.077,00	100,00%
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UND	171,02	3,00	0,00	3,00	513,06	0,00	513,06	100,00%
7.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020_PS	UND	902,13	1,00	0,00	1,00	902,13	0,00	902,13	100,00%
8	PAISAGISMO						3.958,38	0,00	3.958,38	
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	21,47	50,00	0,00	50,00	1.073,50	0,00	1.073,50	100,00%
8.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	5,07	146,50	0,00	146,50	742,75	0,00	742,75	100,00%
8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	UND	140,85	3,00	0,00	3,00	422,55	0,00	422,55	100,00%
8.4	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	205,46	2,00	0,00	2,00	410,92	0,00	410,92	100,00%
8.5	PLANTA - FLAMBOYANZINHO DE JARDIM (CAESALPINIA PULCHERRIMA) H=3,00M. FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	320,15	2,00	0,00	2,00	640,30	0,00	640,30	100,00%
8.6	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	24,73	15,00	0,00	15,00	370,95	0,00	370,95	100,00%
8.7	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	8,47	30,00	0,00	30,00	254,10	0,00	254,10	100,00%
8.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	96,25	0,45	0,00	0,45	43,31	0,00	43,31	100,00%
9	ACESSIBILIDADE						1.117,20	0,00	1.117,20	
9.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVA COR, 02 DEMÃOS	UND	372,40	3,00	0,00	3,00	1.117,20	0,00	1.117,20	100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS						1.278,84	0,00	0,00	
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UND	1.278,84	1,00	0,00	0,00	1.278,84	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							78.210,63	9.543,60	75.766,16	96,87%

PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, DE ACORDO COM A CURVA ABC DA REFERIDA OBRA, QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO DA OBRA, TEMOS A SEGUINTE PROPORÇÃO ENTRE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS:

- MÃO-DE-OBRA: 10,55%, equivalente a R\$ 1.006,85 (para esta medição)

- MATERIAL: 89,45%, equivalente a R\$ 8.536,75 (para esta medição)

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.18 15:50:44 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO
MORAES - 02042151459
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, GN=Gladden Empreendimentos e Locações Ltda, CN=RONEY MARCOS LOURENÇO, email=roney@gladden.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:50:44 -03'00'
Localizador: 02042151459
Formato: PDF
Versão: 2025.2.0

JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA - 9219498243
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, GN=Gladden Empreendimentos e Locações Ltda, CN=JOAO BATISTA DA SILVA, email=joao@gladden.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 16:24:16 -03'00'
Localizador: 9219498243
Formato: PDF
Versão: 2025.2.0

MEMORIAL DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 003

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE					OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDO NO PERÍODO				
6	MOBILIÁRIO URBANO E BANCOS								
6.3	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS); BASE TRIPLA, MÍNIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MÃO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)	M2	79.53	120,00	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÕES	Serviço executado - vide projeto básico
								120,00	120,00
								Total item 6.3	120,00

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITAI O HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.18 15:53:40 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO



RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
TÉCNICO EXECUÇÃO

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
ID= C=BR, O=MICR-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A=1, OU=ReceitaConfidencial, OU=25162341086157
OU=AC Synguard Multiples, CN=JOAO BATISTA
DA SILVA:92194982434
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 19:35:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BERNADETH NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

VISÃO GERAL DA OBRA

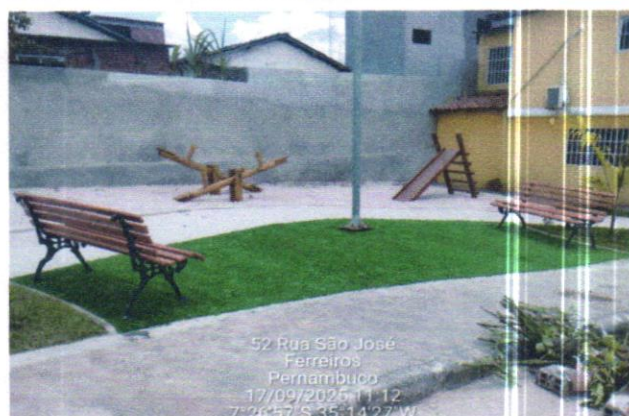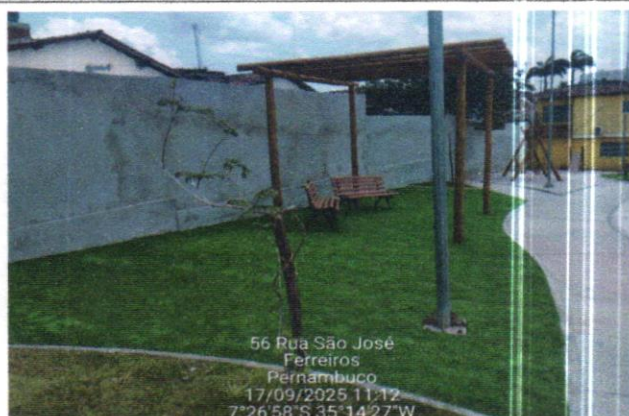

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

**ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃOAssinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.18 15:51:06 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO**RONY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:02042151459**GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃOAssinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA:02042151459
Data: 2025.09.18 15:51:06 -03'00'
Certificado: 02042151459
Algoritmo: SHA-256
Versão: 1.0.0**JOAO BATISTA
DA
SILVA:921949824
34**Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:921949824
Data: 2025.09.18 15:51:06 -03'00'
Certificado: 921949824
Algoritmo: SHA-256
Versão: 1.0.0
