

**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Nota de Subempenho

0171/0003**Dados do Fornecedor**

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Cidade TIMBAUEA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ORÇAMENTO, QUE INTEGRA AO EDITAL COMO ANEXO I - PROCESSO: Nº 028/2021 NA MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 001/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 28/12/2021 A 28/06/2022. RESTADO UM SALDO A SER EMPENHADO EM 2022 NO VALOR DE R\$ 90.821,36. REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAO (INSS REF A MAO DE OBRA, INSS NOTAY		Valor Bruto R\$: 18.708,24
Código 10 10 10 01 4.4.90.51.99 01.031.3000.1001.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Ficha: 8002

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 16/09/2022	Vencimento 20/09/2022	Saldo Anterior:	158.531,79
Licitação (modalidade) OBRA CONVITE	Nº da Licitação 00028/21	Processo	Valor do Subempenho:	18.708,24
Requisição	Documento NOTA FISCAL		Liquidado até a data:	82.632,04
			Saldo Atual:	75.899,75

Descontos: 9012 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 823,16	Valor Liquido R\$: 17.885,08
--	---

VALOR A SER PAGO R\$

17.885,08

dezesete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria 16/09/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 16/09/2022 Responsável	
Liquidado em :16/09/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 16/09/2022 GILCELO OLIVEIRA PONTES	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/09/22 MARIA REGIANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº:

Conta: 185-4

Data: 16/09/2022

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 17.885,08
dezesete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: / / Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA****SECRETARIA DA FAZENDA****NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Dr. Alcebádes N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL: (81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota:

00000102

Competência:

SET/2022

Data e Hora Emissão:

16/09/2022 08:46:15

Código de Verificação:

S1LH-VNV2D**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

FERREIROS - PE

Local da Prestação:

FERREIROS - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.610.140/0001-35

Inscrição Municipal:

524748

Nome/Razão Social:

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA, 123 A

Município:

TIMBAÚBA

UF:

PE

CEP:

55870000

E-mail:

ramostricolor.servcont@gmail.com

TEL:

8136313847**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

08.825.713/0001-04

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

ISENTO

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Endereço:

PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO

Município:

FERREIROS

UF:

PE

CEP:

55880000

E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Informações:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021 CARTA CONVITE N.º 002/2021**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE #QTD:1 - V.UND.:R\$18.708,24 - TOTAL.:R\$18.708,24

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021 CARTA CONVITE N.º 002/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO 003

60% MATERIAL = R\$ 11.224,94

40% MÃO DE OBRA = R\$ 7.483,30

TOTAL = R\$ 18.708,24

11% = 823,36 -> INSS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0446-4

CONTA CORRENTE - 45.457-0

ATESTO
Atesto (anos) a realização/fornecimento de serv e ou produtos conforme especificação da nota fiscal.*elenilton*
Funcionário Responsável
Mat: 170*17.885,08***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.708,24 - 823,36:**

Atividade Prestada:

4399103 -

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
6.922,05	0,00	18.708,24	3,00%	561,25
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
11.224,94				

OUTRAS INFORMAÇÕES- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

49882836373608

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIR
Conta Origem:	0877/006/00000185-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.825.713/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0446/46457-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONFIANCA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	10.610.140/0001-35
Valor:	R\$17.885,08
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	99999-Outros
Identificação da Operação:	VALOR REF A 3 PART CONSTR
Histórico:	VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME BOLETIM

Data de Débito:	16/09/2022
Data da Operação:	16/09/2022
Código da Operação:	00124899
Chave de Segurança:	8XN24F3HZ77TLZ87

CPFs Autorizadores:
064.266.764-03
050.039.284-67

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.106-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: -	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 261 DIAS PRAZO RESTANTE: 99 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 18.708,24 VALOR ACUMULADO: R\$ 82.632,07 % ACUMULADO: 33,14% PERÍODO: 31/08/2022 À 15/09/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022
--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				4.091,12		303,10		1.838,90		2.652,80
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,84	4,00	371,36	0,30	27,85	1,33	123,47	2,67	247,88
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	96,00	3.629,76	7,28	275,25	32,13	1.214,83	63,87	2.414,92
1.0	INFRAESTRUTURA				286,31				140,30		145,01
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8. ESPESSURA 5 CM. PREPARO MECÂNICO	M3	39,30	7,26	285,31	-	-	3,57	140,30	3,69	145,01
2.0	FUNDAÇÕES				26.087,96				26.059,75		28,20
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.820,52	9,25	26.087,96	-	-	9,24	26.059,75	0,01	28,20
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				80.590,44		17.746,90		38.862,94		42.018,39
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ	M2	49,47	203,60	10.072,09	-	-	57,39	2.839,08	146,21	7.233,00
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ	M2	53,22	739,29	39.345,01	270,95	14.419,95	608,73	32.396,61	130,56	6.948,40
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF 06/2014	M2	3,86	879,29	3.394,05	861,75	3.326,35	861,75	3.326,35	17,54	67,70
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M2	22,84	879,29	20.082,98	-	-	-	-	879,29	20.082,98
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	39,15	196,33	7.666,31	-	-	-	-	196,33	7.666,31
4.0	FORRO				8.025,00						8.025,00
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF 09/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	-	-	-	-	214,00	8.025,00
5.0	PISOS				16.537,60						16.537,60
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8	M2	39,30	158,45	6.227,08	-	-	-	-	158,45	6.227,08
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEI 5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESP. DA JUNTA - 6MM)	M2	48,18	214,00	10.310,52	-	-	-	-	214,00	10.310,52
6.0	ESQUADRIAS				19.418,96						19.418,96
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	375,06	30,66	11.499,33	-	-	-	-	30,66	11.499,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR, AF 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	-	-	-	-	7,14	3.428,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE, ACABAMENTO E CONTAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	557,99	8,05	4.491,01	-	-	-	-	8,05	4.491,01
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.437,43						23.437,43
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTIQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	-	-	-	-	25,00	448,75

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.15 13:44:42 -03'00'

elavation goma 120 sauzo 120

707-909-964.40

710



3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 261 DIAS PRAZO RESTANTE: 99 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 18.708,24 VALOR ACUMULADO: R\$ 82.632,07 % ACUMULADO: 33,14% PERÍODO: 31/08/2022 À 15/09/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022
	RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 ADITIVO DE VALOR: - PE20220827095		

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA CONTRATADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL. COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98					2,00	59,98
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL. COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,65								
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80					60,00	10.579,80
7.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00					500,00	1.555,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00					600,00	3.756,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00					200,00	1.534,00
7.8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,67	300,00	2.601,00					300,00	2.601,00
7.9	ILUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	82,94	35,00	2.902,90					35,00	2.902,90
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS				9.566,55						9.566,55
8.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASCOS EM ALVENARIA - ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96					8,00	568,96
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	474,60					5,00	474,60
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26					3,00	310,26
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	429,90	3,00	1.277,70					3,00	1.277,70
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	181,85	3,00	545,55					3,00	545,55
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50X0,80 M PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67					1,00	758,67
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 1.20X0,80 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61					1,00	263,61
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO DIAM DE 1/2 POL, COM APELADOR, REF 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,26	5,00	346,30					5,00	346,30
8.9	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	18,46	200,00	3.692,00					200,00	3.692,00
9.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80					4,00	222,80
8.11	CURVA EM 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,06	60,00	543,60					60,00	543,60
8.12	TÉ PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	UN	11,25	50,00	562,50					50,00	562,50
8.0	PINTURA				10.202,55						10.202,55
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55					641,67	10.202,55
10.0	COBERTURA				6.022,55	688,04		688,04			6.363,71

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.09.15 13:44:51 -03'00'

Clayton Gomes do Souza Rios
 709.909.964.40



3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 062/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 261 DIAS PRAZO RESTANTE: 99 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 18.708,24 VALOR ACUMULADO: R\$ 82.632,07 % ACUMULADO: 33,14% PERÍODO: 31/08/2022 À 15/09/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: -		

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UMT.	PLANILHA CONTRATADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO				
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total			
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	89,59	4.258,21	-	-	-	-	89,59	4.258,21			
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	16,50	106,93	1.764,34	39,93	658,84	39,93	658,84	67,00	1.105,50			
11.0	LAJE				42.844,88				15.872,84		26.971,23			
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PIPISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	305,26	42.544,06	-	-	113,89	15.872,84	191,37	26.971,23			
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60				-		2.643,60			
12.1	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF-04/2019-P	M	90,95	12,00	1.091,40	-	-	-	-	12,00	1.091,40			
12.2	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	-	-	-	-	3,00	720,63			
12.3	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	-	-	-	-	3,00	831,57			
VALOR TOTAL BM 03: DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				R\$	249.353,15	TOTAL 3ª MEDIÇÃO	R\$	18.708,24	TOTAL ACUMULADO	R\$	82.632,07	TOTAL SALDO	R\$	166.721,09

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
Dados: 2022.09.15 13:45:05 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELO FISCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

C.P.F.: 708-909-964-40

MAT.: 110

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP: 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
 LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
 EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
 DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	COMP	LARG	AL TURA	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Proporcional ao andamento da obra	H	4,00	7,58%			0,30
							Total item 1.1
							0,30
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Proporcional ao andamento da obra	H	96,00	7,58%			7,26
							Total item 1.2
							7,26
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.						
	1º Pavimento	M2					
			4,00	33,70		3,20	107,84
			7,00	3,65		3,20	48,72
				2,50		3,20	56,00
				1,90		3,20	6,08
				8,70		3,20	27,84
				3,95		3,20	12,64
				8,40		3,20	36,88
	Desconto da abertura das portas		7,00	0,60		2,10	-1,26
				0,70		2,10	-10,29
				1,50		1,00	-1,50
							Total item 3.2
							270,95
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M2					
			22,00	2,65		3,10	180,73
			4,00	3,65		3,10	45,26
			2,00	12,80		3,10	79,36
			2,00	3,00		3,10	18,60
	Desconto da abertura das portas		14,00	0,70		2,10	-20,58
			2,00	32,80		3,10	203,36
	1º Pavimento			33,70		3,20	107,84
			8,00	3,65		3,20	93,44
			14,00	2,50		3,20	112,00
			2,00	1,90		3,20	12,16
			2,00	8,70		3,20	55,68
	Desconto da abertura das portas		2,00	0,60		2,10	-2,52
			14,00	0,70		2,10	-20,58
			2,00	1,50		1,00	-3,00
							Total item 3.3
							861,75
10.0	COBERTURA						
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2					
	Parte da estrutura de coberta		30,00%	33,70	3,95		39,93
							Total item 10.2
							39,93

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.15 13:45:15 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

M. Margarida Pereira Dias
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CNPJ: 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP: 55870-000

clavilton
CPF: 707-909-964-40
MAT: 110



CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.15 13:45:27 -03'00'


elavitor
MAT: 110



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 15/09/2022

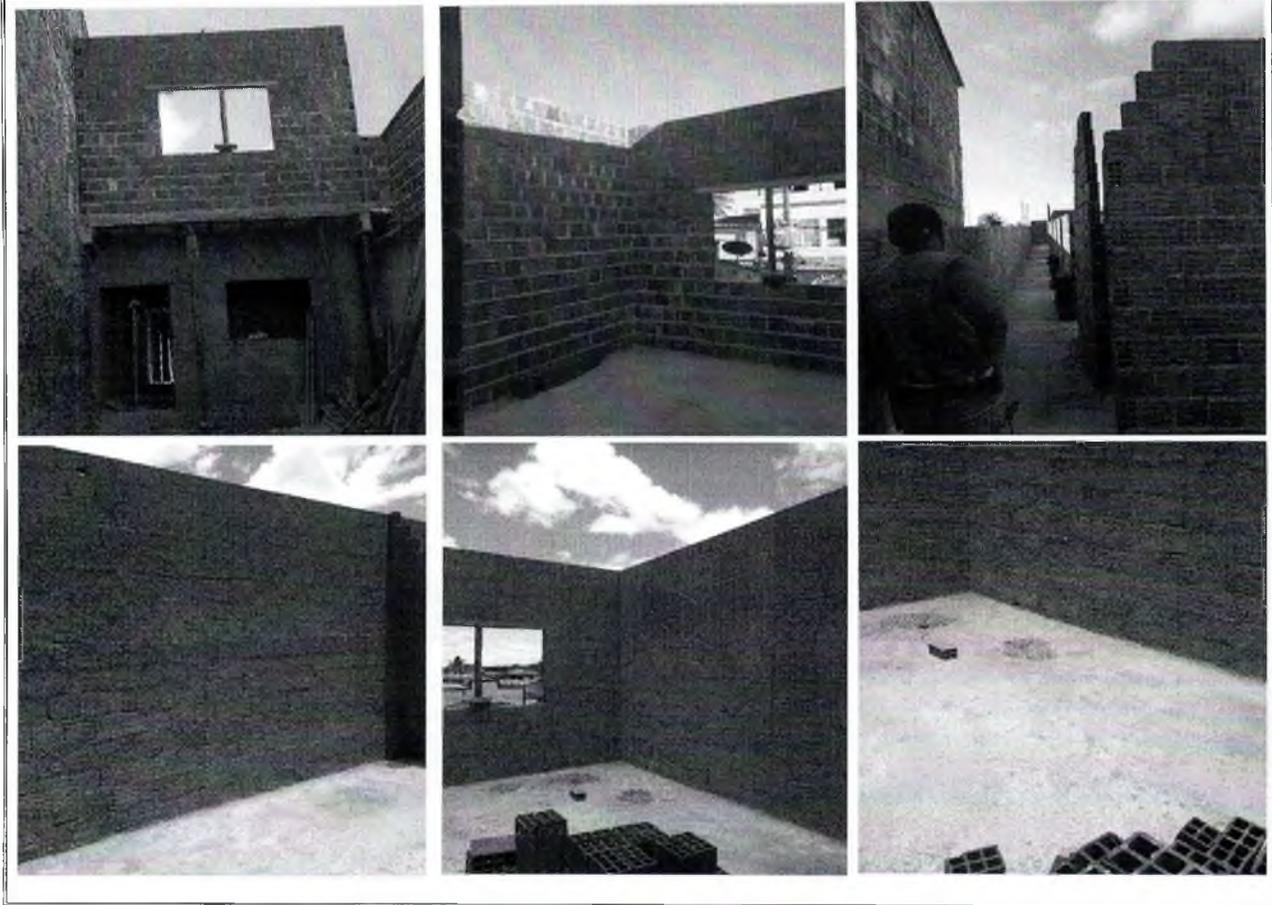

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.09.15 13:45:40
+100'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CPF: 708-909-964-40
MAT: 110

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúta-PE / CEP: 55870-000
