

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 29/02/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 24.124,74

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO

CONTRATO R\$: 59.338,85

CONTRATO: 003/2024

MODALIDADE: TP 004/2023

PRAZOS DE EXEC.: 16/02/2024

15/06/2024

ADITIVO R\$: 0,00



ORDEN DE SERVIÇOS: 16/02/2024

PRAZO (DIAS): 120

ADITIVO (DIAS): -

C. ADITADO R\$: 59.338,85

EMPRESA CONTRATADA: IMELO CONSTRUTORA LTDA

PROPRIETÁRIO: FABRÍCIO SOUZA LANDIM

DATA FINAL: 15/06/2024

CNPJ: 50.689.599/0001-90

CPF: 067.557.324-60

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/02/2024

P. RESTANTE DIAS: 107

RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARLA STHEFANY DE OLIVEIRA LACERDA

CREA: 160.985.063-7

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/02/2024

SALDO R\$: 36.214,11

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4
CREA/RPN: 160.666.136-1
CREAR/PN: 160.991.108-3, PE20241094441

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PRESTADO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Rev 02_01/2022 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m ²	632,58	8,00	8,00	8,00	5.060,64	5.060,64	5.060,64	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO/RENOVAÇÃO/REABILITAÇÃO TRAVESSA 1 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS,						52.751,69	19.064,10	19.064,10	
2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2021	m ²	95,92	126,00	0,00	0,00	12.085,92	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	73,03	56,00	0,00	0,00	4.089,68	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00%
2.2	TRAVESSA 2 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS,						16.813,63	0,00	0,00	
2.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2021	m ²	95,92	128,25	0,00	0,00	12.301,74	0,00	0,00	0,00%

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.02.29 17:43:48 -03'00"

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat: 608-4



Documento assinado digitalmente
FABRÍCIO SOUZA LANDIM
Data: 29/02/2024 17:30:29 -0300
Verifique em https://validar.rh.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO				
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	73,03	57,00	0,00	0,00	4.162,71	0,00	0,00	0,00%	
2.2.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00%	
2.3	TRAVESSA 3 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETH						19.413,28	19.064,10	19.064,10		
2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2021	m²	95,92	148,50	148,50	148,50	14.244,12	14.244,12	14.244,12	100,00%	
2.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	73,03	66,00	66,00	66,00	4.819,98	4.819,98	4.819,98	100,00%	
2.3.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	174,59	2,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00%	
3.0	SERVIÇOS FINAIS						1.526,52	0,00	0,00		
3.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid	1.526,52	1,00	0,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL								59.339,95	24.124,74	24.124,74	40,66%

OBRIGATORIO O CARIMBO:

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.02.29 17:45:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudioonor Manoel de Oliveira
Sec de Otrase lthranismo
1508-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

gov.br

FABRÍCIO SOUZA LANDIM
Data: 29/02/2024 17:32:29 -0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

MEMORIAL DE CÁLCULO

BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO



RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Rev.02_01/2022 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m2	632,58	8,00		8,00	Serviço finalizado
					Total a medir Item 1.1	8,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE RENGUE/SINALIZAÇÃO						
2.3	TRAVESSA 3 - LOTEAMENTO MARIA BERNADETE						
2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2021	m²	95,92	148,50		0,00	Serviço em andamento
					20,00	90,00	
					13,00	58,50	
					Total a medir Item 2.3.1	148,50	
						TOTAL	
						33,00	Serviço em andamento - Lado Esquerdo
2.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	73,03	68,00		33,00	Serviço em andamento - Lado Direito
					COMPRIMENTO		
					33,00	33,00	
					Total a medir Item 2.3.2	68,00	

EMPRESA: **FERREIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.**
 Assinado de forma digital por: **Henrique Cavalcante de Almeida**
 CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 ALMEIDA:07963031429
 DADOS:2024.02.29 17:45:27 -03'00'
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por: **Cláudio Marcelo de Oliveira**
 Sec. de Obras e Urbanismo
 ALMEIDA:07963031429
 DADOS:2024.02.29 17:45:27 -03'00'
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 SEÇÃO DE CONTRATO

Documento assinado digitalmente por: **FABRÍCIO SOUZA LINDIM**
 FABRÍCIO SOUZA LINDIM
 DATA:29/02/2024 17:42:07 -03'00'
 Verifique em: <https://validar.it.gov.br>





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS - EMENDA TEREZA LEITÃO

PLACA DE OBRAS



VISÃO GERAL DA OBRA

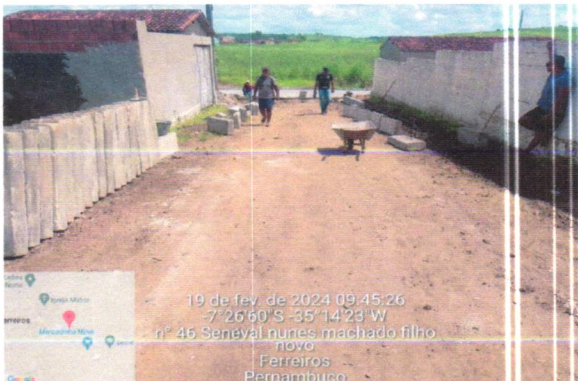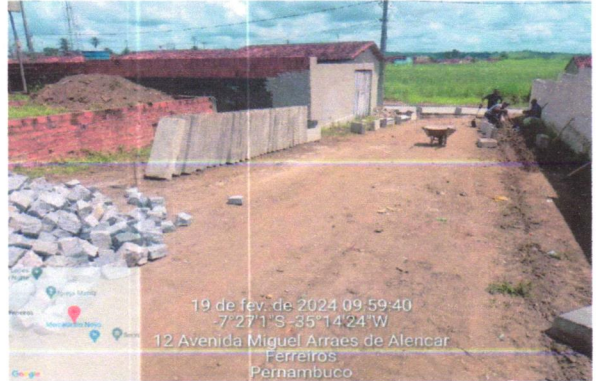

Claudionor Mancel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

Documento assinado digitalmente
FABRICIO SOUZA LANDIM
Data: 29/02/2024 17:35:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

E OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.02.29 17:45:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
